Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF

Tertialrapport 3. tertial 2022
Status pr. 31.12.2022

Utarbeidet av:
Tom Einertsen – Leder konseptfasen

Oslo 18. januar 2022

0 Prosjektinformasjon

1 Prosjektets navn: Videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF
2 Helseforetak: Sykehuset Innlandet HF
3 Fase: Konseptfase
4 Forventet tidspunkt for B3 beslutning: Desember 2023
5 Areal nybygg BTA og evt. ombygd areal: Avventer retningsvalget
6 Kort beskrivelse av prosjektet:
Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet 28. mai 2021 sak 058-2021 Videreføring av planer for utviklingen av Sykehuset Innlandet HF, hvor ny sykehusstruktur ble vedtatt. I tillegg ble det vedtatt at det skal utredes et reelt nullalternativ (null-pluss alternativ), jf. Veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.

Status per 3. tertial 2022

1 Sammendrag og overordnet vurdering

Prosjektet har holdt fremdriftsplanen og gjennomført alle planlagte milepæler i perioden (se figur 1).

Konseptrapport steg 1 og valget mellom null-pluss alternativet og Mjøssykehus-alternativet ble fremlagt for beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente at Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet.

Som oppfølging til Helse Sør-Øst RHF sitt vedtak om videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF har helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i foretaksmøte 21. november 2022 bedt Helse Sør-Øst RHF om å belyse forhold som kan redusere risiko. Dette må gjøres før foretaksmøte kan ta stilling til videreutviklingen av Sykehuset Innlandet.

I foretaksmøte 21. november 2022 ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. Videre skal Helse Sør-Øst RHF belyse hvilke risikoreduserende tiltak som vil bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. Dette siste skal belyses både i Mjøssykehus-alternativet og «Null-pluss»-alternativet. Fristen for arbeidet er satt til 10. mars 2023.

Foretaksmøtet vedtok:
Foretaksmøtet ber Helse Sør-Øst RHF innen 10.03.23 belyse:

- *hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom*
- *mulige risikoreduserende tiltak knyttet til bibehold av medarbeidere i fasen fram til byggestart*

Tilleggsoppdraget del 1 (første kulepunkt over) og del 2 (andre kulepunkt over) ble definert og gjennomgått med medvirkning fra blant annet brukerutvalget, TV20 og utvidet ledersamling før innspillsnotat for hvert deloppdrag ble utsendt ultimo desember 2022 med tidsfrist 11. og 18. januar 2023 for henholdsvis deloppdrag 2 og deloppdrag 1.
Med bakgrunn i hovedprogrammet fra konseptrapport etter steg 1 har prosjektet utarbeidet bygningsmessige konsepter for å evaluere mulighetene for trinnvis utbygging.

2 Framdrift

Status framdrift:

Figur 1 viser overordnet plan for gjennomføring av konseptfasen.

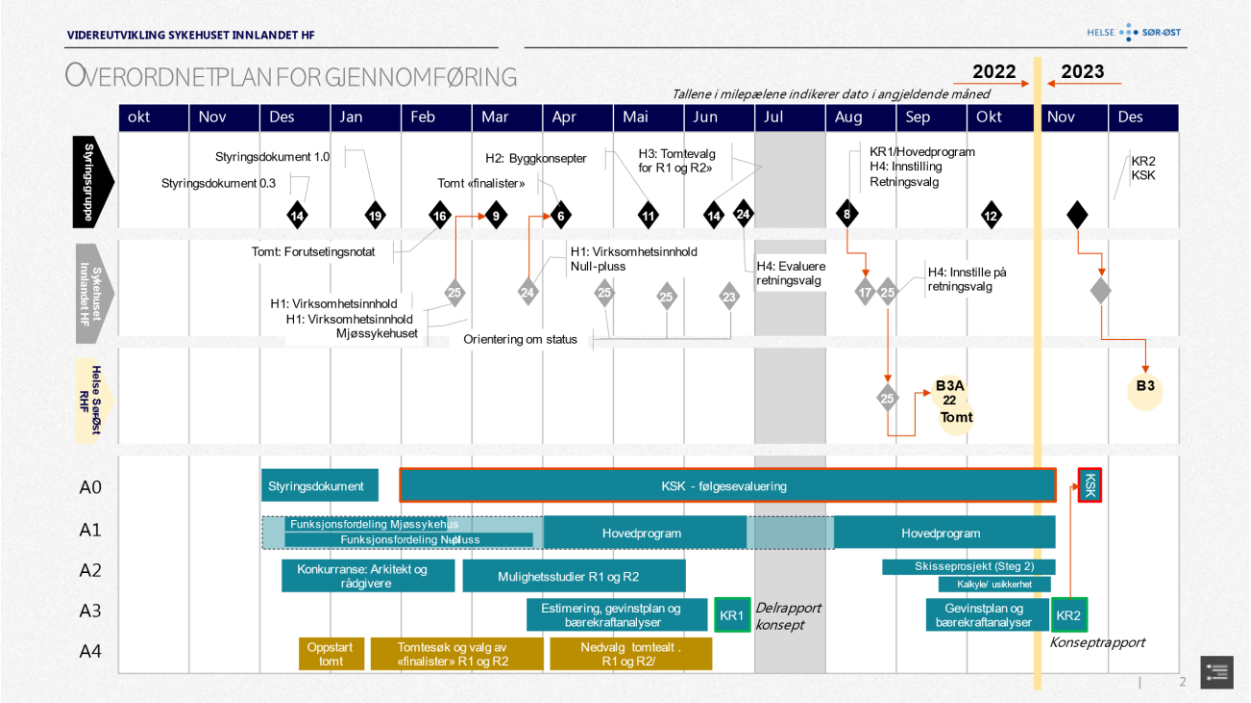

Figur 1

Fremdriftsplan for tilleggsoppdraget fra Helseministeren:

- 10. januar: Gjennomgang med ledergruppen i SI
- 11. januar: Frist for innspill for deloppdrag 2
- 12. januar: Gjennomgang på styreseminar for styret i SI
- 16. januar: Status for styringsgruppen
- 18. januar: Frist for skriftlige innspill for deloppdrag 1
- 24. januar: For deloppdrag 1 gjennomgå innspill på ledermøte i SI
    - Forankre beskrivelse for «trinnvis utbygging»
    - Beskrivelse av «trinnvis innflytting» og hvordan dette bidrar til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom

- 25. januar: Styret i SIHF behandler deloppdrag 2
- 27. januar: Første utkast til felles rapport
- 30. januar: Styringsgruppemøte – innspill til første utkast til rapport
- 31. januar: Siste innspill fra ledergruppen i SI for deloppdrag 1
- 9. februar: Behandling av tilleggsoppdrag i styringsgruppen
- 22. februar: Behandling i styret i SIHF
- 9. mars: Behandling i styret i HSØ
- 10 mars: Frist for oversendelse til Helse- og omsorgsdepartementet

3 Økonomi

Tabell under viser budsjett og påløpt i perioden:

I perioden		**Akkumulert**		**Budsjett Konseptfasen**	**Forpliktet** (totalt)	**Total-budsjett** (prisnivå jf. styresak)	**Siste pris-justering**
Budsjett	*Faktisk*	*Budsjett*	*Faktisk*				
14,2	14,2	75	45,5	75			

4 Aktiviteter

Hovedaktiviteter i perioden

- Konseptrapport steg 1 og valget mellom null-pluss alternativet og Mjøssykehus-alternativet ble behandlet i styret i Sykehuset Innlandet HF, først til orientering og senere til vedtak. Styret i Sykehuset Innlandet tok konseptrapport steg 1 til orientering og et flertall innstilte på Mjøssykehus-alternativet.
- Konseptrapport steg 1 og valget mellom null-pluss alternativet og Mjøssykehus-alternativet ble fremlagt for beslutning i styret i Helse Sør-Øst RHF 22. september 2022. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner at Mjøssykehus-alternativet legges til grunn for den videre utviklingen av Sykehuset Innlandet.
- I foretaksmøte 21. november 2022 ble Helse Sør-Øst RHF bedt om å belyse hvordan en mulig trinnvis utbygging i Mjøssykehus-alternativet kan bidra til å redusere risiko i omstillings- og utviklingsprosessene organisasjonen må igjennom. Videre skal Helse Sør-Øst RHF belyse hvilke risikoreduserende tiltak som vil bidra til å beholde medarbeidere fram til byggestart. Dette siste skal belyses både i Mjøssykehus-alternativet og «Null-pluss»-alternativet. Fristen for arbeidet er satt til 10. mars 2023.
- Definerte oppdraget og startet medvirkning på tilleggsoppdraget fra foretaksmøte 21. november 2022.

Hovedaktiviteter neste periode

- Ferdigstille tilleggsoppdraget fra Helseministeren iht. gjennomføringsplan vist over

5 Risiko og muligheter

Risiko og muligheter blir utarbeidet etter retningsvalg og oppstart av konseptfasen steg 2

6 Behandling i prosjektstyret/styringsgruppe

Tertialrapporten blir behandlet i styringsgruppen: 9. februar 2023
