

Dialogmøte med leverandører, MTF 2026

Utstyrsanskaffelser til Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Ved Olav Bruflat og Aksel Bonne Øyri, 28.05.26

HELSE  SØR-ØST

Agenda



- Velkommen
- Informasjon om prosjektene Nye Aker og Nye Rikshospitalet
- Utstysprogram Nye Rikshospitalet
- Utstysprogram Nye Aker
- Oslo universitetssykehus sin rolle i prosjektene
- Spørsmål og pause
- Planlegging av anskaffelser og leveranser
- Fremdriftsplan for anskaffelser 2025-2030
- Viktige momenter for leverandørene
- Oppsummering og spørsmål



Nye Aker

HELSE  SØR-ØST

Nye Aker – stort akuttsykehus med lokalsykehusfunksjoner

- **Somatiske sykehusfunksjoner:**
 - Senger: 487
 - Operasjonsstuer: 22
 - Fødestuer: 11
 - Observasjonsplasser: 24
 - Intensivplasser: 24
 - Nyfødtintensiv: 18
 - Poliklinikkrom: 94
 - Høysmitteisolat (luftsmitte) 4 stk
- **Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling**
 - Senger: 303
 - Poliklinikkrom: 106
- **Bruttoareal totalt: ca. 191.000 m²**
 - Nybygg: ca. 170.000 m²
 - Ombygging: ca. 21.000 m²
- **Beregnet kostnad (P50, prisnivå desember 2024): 22,3 mrd. kroner**



Nye Aker








Nye Rikshospitalet

HELSE  SØR-ØST

Nye Rikshospitalet

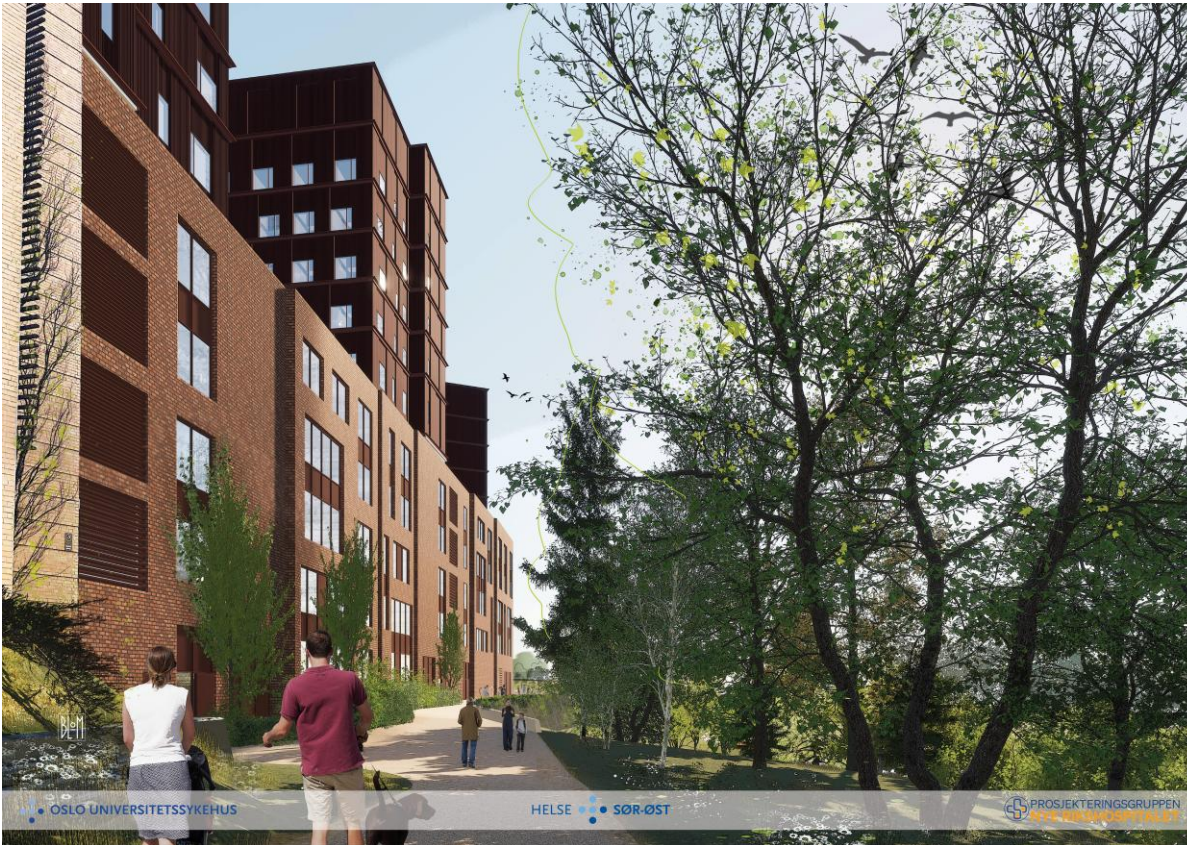

- **Somatiske sykehusfunksjoner:**

- Senger: 441
- Operasjonsstuer: 24 +1
- Fødestuer: 11
- Observasjonsplasser: 19
- Intensivplasser: 60
- Nyfødtintensiv: 42
- Poliklinikkrom: 173

- **Bruttoareal nybygg: ca. 150.000 m²**

- **Beregnet kostnad (prisnivå desember 2024):**

- Nye RH – 22,4 milliarder kroner
- Rokade C1 – 951 millioner kroner

Nye Rikshospitalet

An aerial architectural rendering of the new Rikshospitalet complex. The image shows a large, multi-story building complex with various wings and courtyards. The buildings are primarily brick and concrete, with some green roofs. The complex is surrounded by greenery, including trees and grassy areas. A road with a roundabout is visible in the foreground, and a highway is on the left. The overall scene is a detailed 3D model of the proposed hospital layout.

Utvidelse av
teknisk sentral

Nytt
behandlingsbygg

Nytt barne- og
ungdomssykehus

Utvidelse varemottak

Ny trase for
Sognsvannsveien





Status utstyrsanskaffelser

HELSE  SØR-ØST

Funksjonsutstyr – hva omfatter det?

- Medisinsk teknisk utstyr (MTU)
- Grunnutrustning (GRU)
- Løst inventar

Dette inngår ikke:

- forbruksartikler
- behandlingshjelpemidler
- byggutstyr

Men det er gråsoner



Aktører

- **HSØ PO** – Helse Sør-Øst sin prosjektorganisasjon for OUS-prosjektene
- **Sykehusbygg HF** – engasjert for å lede prosjektorganisasjonen
- **Oslo universitetssykehus HF** – mottaker av byggene med utstyr, infrastruktur og nye systemer. Ansvar for virksomhetsinnhold, medvirkning, forberedelse til drift. Gevinstrerealisering
- **Sykehusinnkjøp HF** – bistår HSØ PO i arbeidet med anskaffelser
- **Sykehuspartner HF** – deltar i anskaffelser med IKT-grensesnitt. Bistår i utarbeidelse av krav og evaluering

Hvor er vi nå?

- Gjennomført forprosjekt og funksjonsprosjekt med medvirkning fra ansatte på OUS
- Utarbeidet utstyrsprogram – dvs alle rom i de nye sykehusene er programmert med utstyr
- OUS bistår med å prioritere utstyr innenfor de økonomiske rammene
- Planlegging av anskaffelser


03.01.058 [D1.U1.G18.03] Observasjon, avklaring

◀ Forrige Neste ▶ Vis logg Skriv ut ▼

Romkjerne RFP Bilder Dokumenter **Utstyr i rom** Bygning

Inn...	Artikkel: Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Eksist...	Prioritet	B...
	016.001	Flowmeter O2	9	0 0		MTU
	016.004	Oftalmoskop-otoskop	2	0 1		MTU
	017.001.02	Pasientovervåking, nivå 2 - medium	9	0 1		MTU
	016.003	Personvekt	1	0 0		MTU
	016.014.01	Sug, ejektor	9	0 0		MTU
	ODZ.014	Pakke, PC, mobiltralle, med batteri	2	0 0		MIT
	GBA.006.14	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1200	2	0 1		INV
	GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	9	0 1		INV
	GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	0 1		INV
	GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	0 1		INV
	GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	9	0 1		INV
	062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	0 0		GRU
	031.004.01	Båre, transport og hvile	3	0 1		GRU
	031.027.02.01	Prosedyrevogn, somatikk	1	0 1		GRU
	062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	0 0		GRU
	062.001.05	Avfallsbøtte, ca. 50 liter	2	0 0		GRU
	061.001.08	Trillebord, lite, med underhylle, ca 50 x 40 x 80 (Bx...	9	0 0		GRU
	031.027.02.01	Prosedyrevogn, somatikk	2	0 1		GRU
	031.002.01.1	Infusjonsoppheng for himlingsmontert skinne, 3 kr...	9	0 1		GRU
	031.002.02	Skinne for infusjonsoppheng, himlingsmontert	9	0 1		GRU
	061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	0 1		GRU
	061.004	Medisinvogn, låsbar	1	0 1		GRU
	016.005	Høydemåler, digitalt	1	0 0		GRU
	031.007	Sykehusseng	6	0 1		GRU

Utstyrsprogram - koordinering

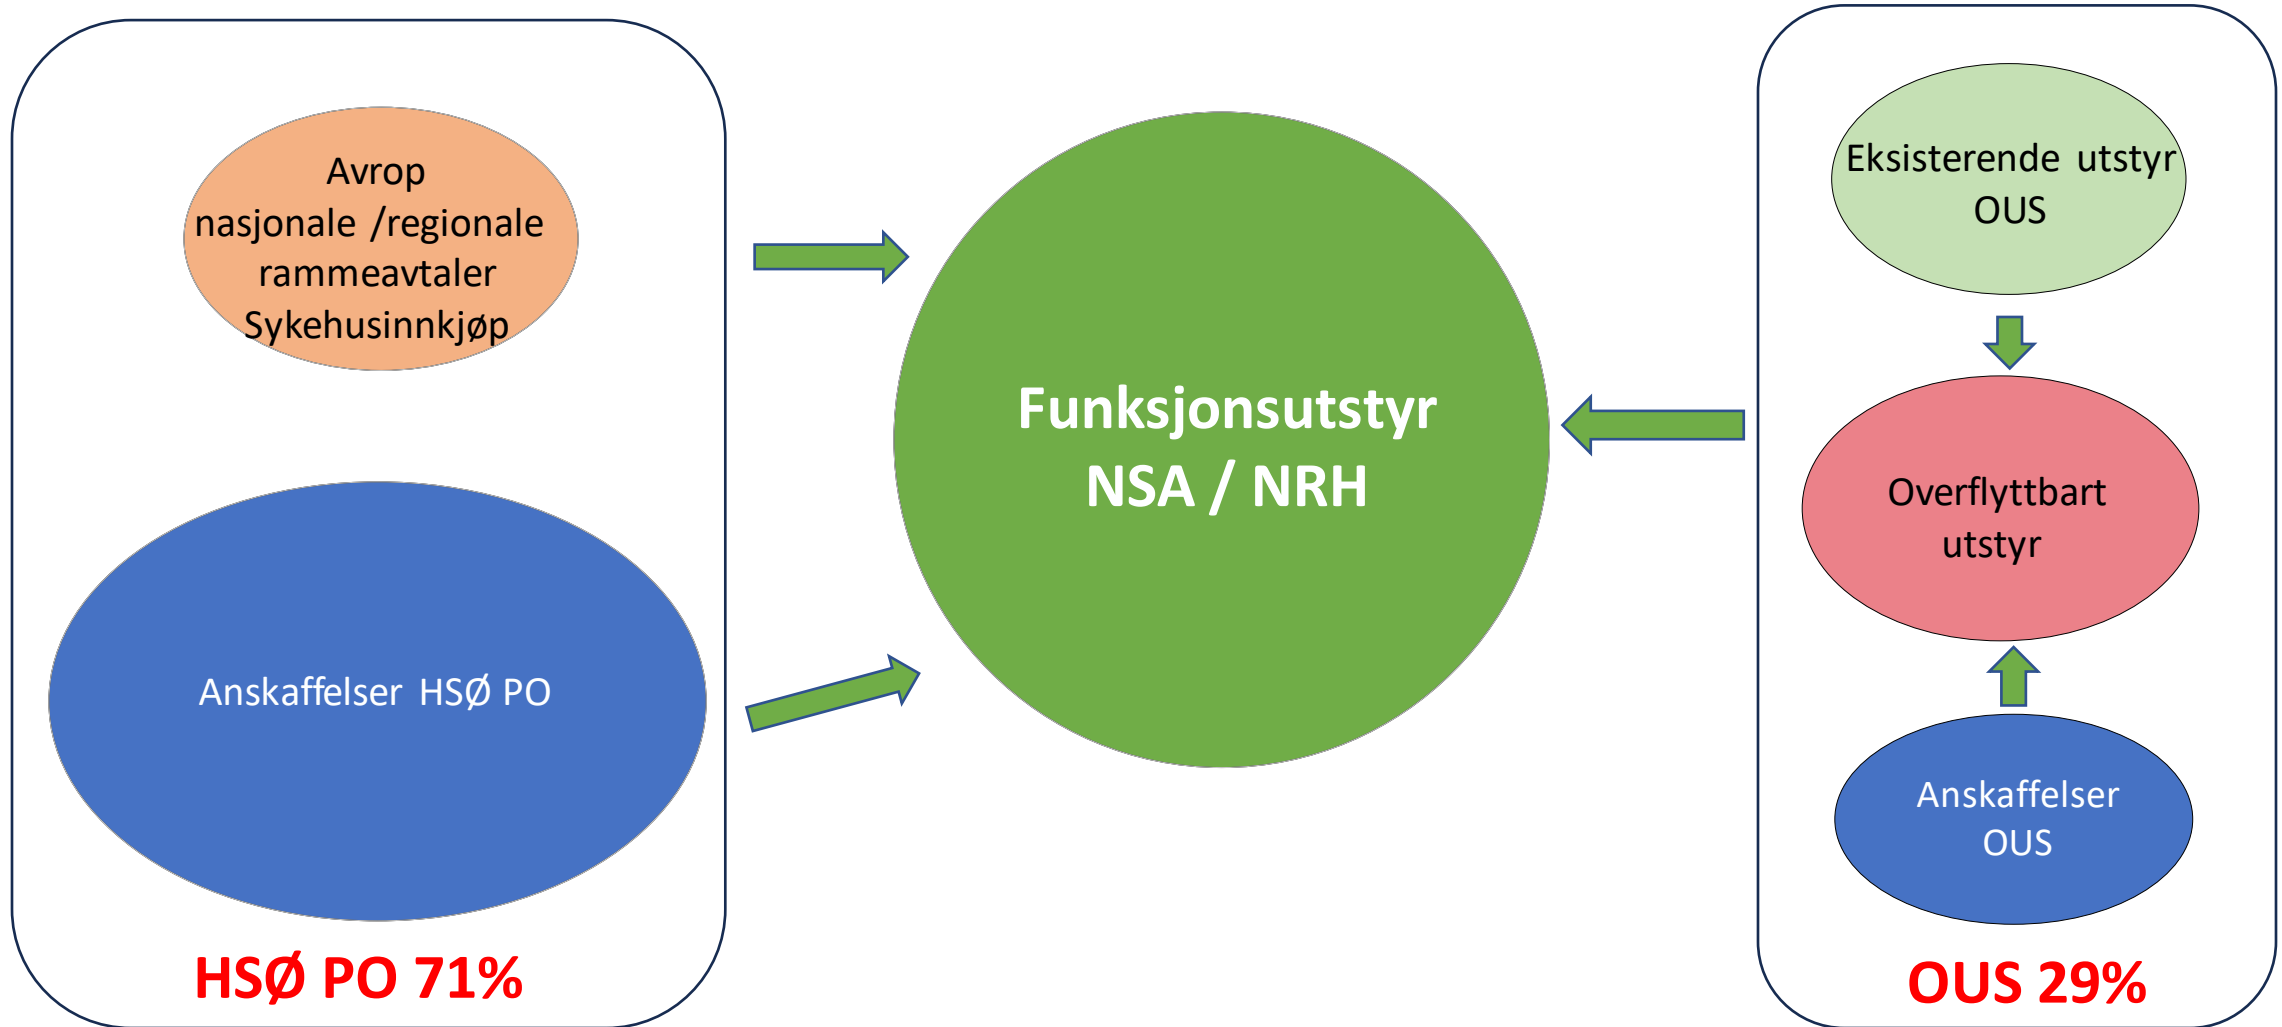

Oslo universitetssykehus HF

Organisering i byggeprosjektene

HELSE  SØR-ØST

Oslo universitetssykehus (OUS) i byggeprosjektene

Organisering av innkjøp

- HSØ PO gjennomfører de fleste anskaffelsene.
- OUS ved Stab utvikling og TIK organiserer anskaffelsesteamene.
- Kategoriansvarlig fra TIK eller OSS har ansvaret for arbeidet innen den enkelte kategori (f.eks. Operasjon, Bilde, ...) .
- Anskaffelsesteamene består av:
 - Personer fra fagmiljøene
 - IKT-kompetanse om nødvendig (OUS og Sykehuspartner HF)
 - Teknisk personell (MTA / OSS)
 - Representanter fra HSØ PO og Sykehusinnkjøp HF

Oslo universitetssykehus (OUS) i byggeprosjektene

Kravspesifikasjon og evaluering

- Anskaffelsesbeskrivelse utarbeides av HSØ PO i samarbeid med kategoriansvarlig fra OUS.
- Anskaffelsesteamene sammen med HSØ PO utarbeider funksjonskrav i anskaffelsene
- Pris blir viktig, men se godt igjennom leverandørkravene. Det vil ikke være som å levere til sykehus i drift.

OUS anskaffer selv

- Ultralyd, alle kategorier, avansert, mobil m.fl.
- Diatermi og laser inkludert ultralydaspirator og benskalpell
- Anestesi/respirasjon: anestesiapparater og ventilatorer for neonatal, barn og voksne.
- Infusjonsutstyr: Infusjons- og sprøytepumper
- Dialyse, PD og CRRT maskiner
- Endoskopiutstyr inkludert videolaryngoskop
- Spesialutstyr nevrologi/nevrofysiologi, eeg, emg og IONM
- Defibrillatorer
- Driftsutstyr som eksempelvis blodtrykksapparater, dopplere, blærescannere, oftalmoskop, flowmeter personvekt m.m.

Planlegging av anskaffelser og leveranser

Organisering i byggeprosjektene

HELSE  SØR-ØST

Nye Rikshospitalet og Nye Aker



Forutsetninger og føringer

- Utstyrsanskaffelsene gjennomføres i henhold til utstyrsprogrammet og innenfor vedtatte budsjетtrammer
 - Utviklet gjennom forprosjekt, funksjonsprosjekt og gjennomføringsfase
- Det er lagt til grunn at NSA og NRH skal gjennomføres i parallell
 - Anskaffelse av funksjonsutstyr skal så fremt det er mulig, gjennomføres felles og på tvers av prosjektene
 - Felles fremdriftsplaner, anskaffelsesbeskrivelser og konkurransegrunnlag
- Anskaffelsene skal bidra til at OUS når overordnede målsetninger for
 - Pasientbehandling, undervisning og forskning
 - Økt driftseffektivitet
- Medisinsk teknisk utstyr standardiseres
 - Avansert undersøkelses- og behandlingsutstyr vurderes spesielt
- Det skal anskaffes velprøvd og robust teknologi
 - Gjennomføring vellykkede leveranser og installasjoner dokumenteres

ANSKAFFELSESPAKKER FUNKSJONSUTSTYR ARH

Bilddiagnostisk utstyr U6C		Laboratorieutstyr U6D		Operasjon, anestesi og intensiv U6E		Terapi og diagnostikk U6F		Grunnutrustning U6G		Løst inventar U6H	OUS
9100 MR	9130 CT	9200 Obduksjonsutstyr	9230 Analyseinstrumenter, øvrig	9400 Operasjonsbord	9405 Operasjon og undersøkelseslamper	9540 Spesialutstyr lunge	9550 Spesialutstyr obstetikk	9600 Elektroniske tøyløsning	9611 Dekontaminator sterilsentral	9800 Kontormøbler	9580 Defibrillatorer
9155 Angio/ intervensjon kardiologi	9150 Angio/ intervensjon perifer	9220 Analysehall, analyseinstrumenter	9250 Kromatografi og massespektrometri	9410 Bildestyring (MIT)	9420 Pasientovervåking og telemetri	9560 Spesialutstyr ØNH/odontologi	9570 Spesialutstyr øye	9612 Autoklav, damp- og lavtemperatur	9713 Automasjon- og robotutstyr sterilsentral	9810 Pasientmøbler	9430 Diatermi og laser
9160 Gjennomlysning	9170 Røntgen, konvensjonell	9260 Blodbank og immunhematologi	9270 Mikrobiologi	9430 Uttaksentraler	9440 Navigasjonsutstyr	9580 EKG	9548 Søvnregistrering	9614 H2O2 Desinfeksjonsanlegg	9615 Endoskopvask (inkl. vaskebord)	9820 Medisinske møbler	9440 Anestesi/ respirasjon
	9190 Samlepakke bilddiagnostikk	9210 Analysehall, automasjon og analysehall komplett	9300 Farmasi	9450 Kuvøser og intensivsenger spedbarn	9460 Samlepakke neonatalutstyr	9590 Samlepakke terapi og diagnostikk		9616 Såpedoseanlegg	9617 Ultralydvaskemaskin	9840 Spesialvogner	9460 Infusjonsutstyr
		9280 Patologi	9320 Varmeskap og inkubatorer	9480 Kirurgiske instrumenter	9490 Samlepakke operasjon /anestesi/intensiv			9618 Grunnutrustning sterilsentral	9620 Vaske- og spyledekontaminatorer	9860 Senger	9500 Dialyse
		9310 Forskning og spesialanalyser	9340 Prøvepreparering og håndtering					9625 Tørkeskap instrumenter	9630 Senge- og madrassvask	9870 Barnemøbler og hobbyartikler	9520 Spesialutstyr nevrologi/nevrofys.
		9330 Mikroskop	9390 Samlepakke labutstyr					9632 Kabinett- og vognvaskemaskiner	9640 Verkstedutstyr	9880 Bårer	9530 Spesialutstyr urologi
		9360 Genteknologi	9350 Kjøle og fryseutstyr til laboratorier					9650 Pasientløftere	9660 Renholdsutstyr	9890 Samlepakke løst inventar	9711 Sykehusseng intermediær

Bilddiagnostisk utstyr

- Bilddiagnostiske avdelinger samlet på samme plan
 - NRH samme etasje som bilddiagnostisk avdeling i eksisterende sykehus
- Funksjonene er organisert i et kluster
 - Sikre driftsmessige synergier
 - Ivaretar vakt- og akutfunksjoner
- Akuttmottakene har egne bilddiagnostiske funksjoner
 - Sambruk ved funksjoner ved behov
- Digital radiografi, CT, MR, angio og intervensjon, PET/CT
 - Hybrid operasjon med avansert bilddiagnostisk utstyr



Laboratorieutstyr

- Det planlegges et felles automatisert prøvepostmottak på Livsvitenskapsbygget som skal motta alle eksterne prøver
- Nye Aker
 - Kjernelab med lokalt prøvemottak og analysehall
 - Utleveringsenhet for blod og mindre laber for mikrobiologi og patologi
 - Prøvetakingsenhet for voksne
- Nye Rikshospitalet
 - Kjernelab med lokalt prøvemottak og analysehall
 - Spesiallaboratorier for hormon og ernæring, forskning og andre spesialanalyser
 - Prøvetakingsenhet for barn og ungdom i nytt bygg, prøvetaking for voksne i eksisterende bygg
- Det etableres rørpostforbindelse mellom Nye Rikshospitalet og Livsvitenskapsbygget
- Det er planlagt desentrale rom for pasientnære analyser (PNA) i begge prosjekter
- Laboratoriefagene er i rask utvikling og det er derfor lagt stor vekt på å tilrettelegge for både generalitet, fleksibilitet og standardisering
- Tilrettelegging for undervisning og forskning

Operasjon, anestesi og intensiv

- Prosjektene består av totalt 46 operasjonsstuer for både elektive og dagkirurgiske pasienter
- Operasjonsstuene er generisk utformet for å gi fleksibilitet i drift.
- Det tilrettelegges for spesialfunksjoner som f.eks.
 - sectio, robot for kirurgiske inngrep, urologi og endoskopi
 - hybride operasjonsstuer som kombinerer avanserte bildemodaliteter og operative inngrep
- Bildestyringssystem
- Pasientovervåking
- Uttakssentraler og operasjonslamper



Figur 5.12 - Operasjonsrom

Terapi og diagnostikk

- Det tilstrebes stor generalitet i området for poliklinikk og dagbehandling
- Endoskopienhet for inneliggende og polikliniske pasienter
- ERCP – Gjennomlysning med takhengt c-bue
- Det tilrettelegges for flere spesialrom som f.eks.
 - søvnlaboratorier
 - lungefunksjonslaboratorier
 - øre- nese, hals
 - kardiologisk poliklinikk
 - fødeavdeling
 - dialyse



Figur 5.20 - Bygg J - Ekspedisjon



Figur 5.21 - Bygg J - Poliklinikk

Grunnutrustning

- Prosjektene har ønsket å legge vekt på fremtidsrettet teknologi, målsetningen er å automatisere så mange arbeidsprosesser som mulig for å understøtte en mer effektiv drift og erstatte manuelt arbeid.
- Senge- og madrassvask skal håndterer hovedmengden senger ved begge prosjekt
- Elektronisk tøyløsning med tøyrom og skap for utlevering og innlevering med RFID teknologi.
- Robotisert renhold med integrasjon mot heiser
- Endoskopivask
 - Sentralisert skoprengjøringsenhet inkludert tørkeskap for endoskop
- Vaske- og spyledekontaminatorer
 - Høyt antall vaske- og spyledekontaminatorer, de fleste gjennomgående til desinfeksjonsrom

Løst inventar

- Funksjonsareal planlegges med støttefunksjoner
 - Kontorer, arbeids- og samtalerom
- Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
- Møbler
- Bårer og prøvetakingsbord
- Undersøkelse- og behandlingsbenker
- Div. spesialvogner

Primærpalett: Gjennomgående i alle bygg og etasjer



+

Sekundærpalett: Spesifikt for hver etasje/funksjon



Figur 4.24 - Eksempel på en farge- og materialpalett som skal utarbeids spesielt for det nye rikshospitalet i neste fase

Oppstart av anskaffelse

- Utarbeide anskaffelsesbeskrivelse
 - Beskrivelse av omfang, føringer og rammer
 - Gi informasjon om planlegging, gjennomføring og leveranse
 - Deltakelse fra andre fag
- Forberede anskaffelse
 - Vurdering av størrelse og kompleksitet
 - Antall enheter, ulike bygg og leveransetidspunkt
 - Funksjoner og grensesnitt
- Rammeavtaler
 - Kan avtalen gjennomføres felles for flere?
 - Er avtalen aktuell for en felles regional eller felles nasjonal avtale?

Prosjekt: Nye Aker og Nye Rikshospitalet						
Titel: Anskaffelsesbeskrivelse U6G 9620 Vaske- og spyledekontaminatorer						
02	Godkjent for implementering		28.03.25	LIA	CVE	ELB
01	9620 Vaske- og spyledekontaminatorer		11.03.25	LIA	CVE	ELB
Rev.	Formål med utgivelsen		Rev. dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontrakt/leverandørs logo:		Bygg nr.:	Etasje nr.:	Systemgr.:	Antall sider:	
					Side 1 av 17	
Prosjekt:	Utgivernr.:	Fag:	Dok. type:	Lapernr.:	Rev.nr.:	Status:
ARH	0000	U	SP	0016	02	G



Suksessfaktorer, risiko og avhengigheter

- Beskrivelse av suksessfaktorer og risikoforhold
 - Hva kan bidra til en vellykket anskaffelse, leveranse og igangkjøring av utstyret?
 - Risikoforhold med tiltak beskrives
- Velge en strategi tilpasset markedsmessige forhold
- Sikre god konkurranse
- Vurdere og/eller tilpasse inndeling/volumer til kapasitet i markedet
 - Delkontrakter
- Balansere risiko
- Innspill til inndeling av anskaffelsespakker fra markedet
 - Behov for dialog med markedet
 - Per anskaffelseskategori eller -pakke

Fremdriftsplan for anskaffelser 2025-2030

Hovedfremdriftsplan for prosjektene


- Hvert prosjekt har en hovedfremdriftsplan som beskriver viktige milepæler og tidslinjer for prosjektene.
- Fremdriftsplanen for funksjonsutstyr er planlagt ut fra prosjektenes hovedfremdriftsplan
- Byggeplassens framdrift styrer tidspunkt for leveranser av funksjonsutstyr.

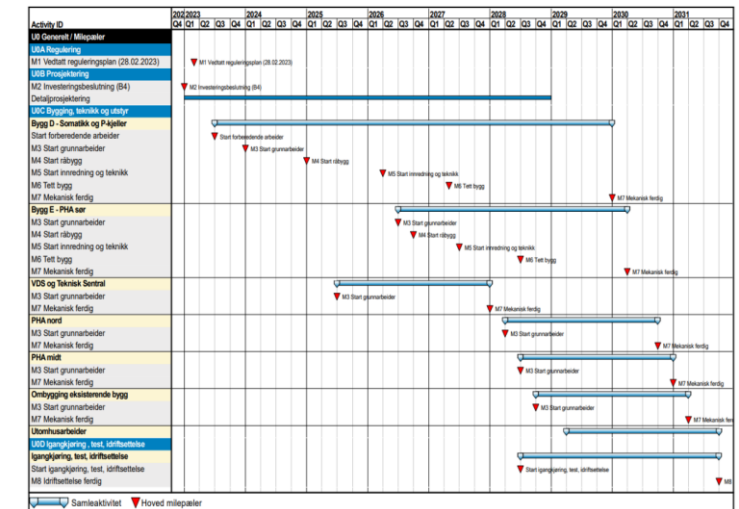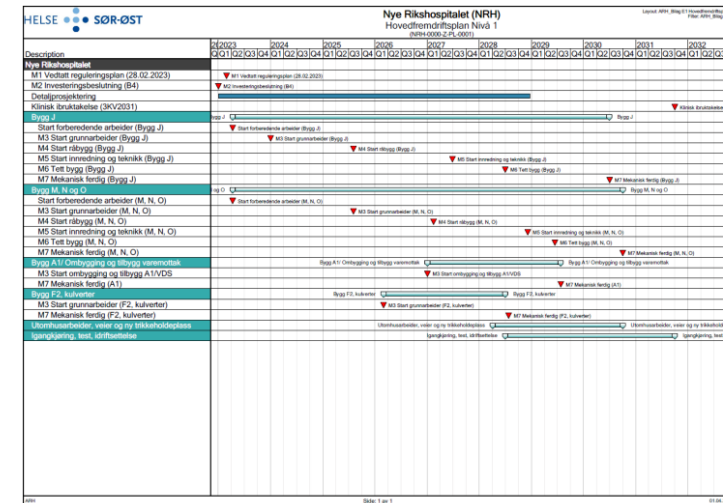

Fremdriftsplan for anskaffelse

- NSA og NRH skal gjennomføres i parallell
 - Anskaffelse av funksjonsutstyr skal så fremt det er mulig, gjennomføres felles og på tvers av prosjektene
 - Det utarbeides felles fremdriftsplaner, anskaffelsesbeskrivelser og konkurransegrunnlag
- Viktig å anskaffe bygg- og installasjonspåvirkende utstyr (BIP-utstyr) først
- BIP-utstyr krever detaljprosjektering med prosjekteringsgrupper, IKT og leverandør etter inngåelse av kontrakt
- Etter kontraktsinngåelse vil ansvar for oppfølging av prosjektering og leveranse skje i det enkelte prosjekt

Fremdriftsplan for anskaffelse

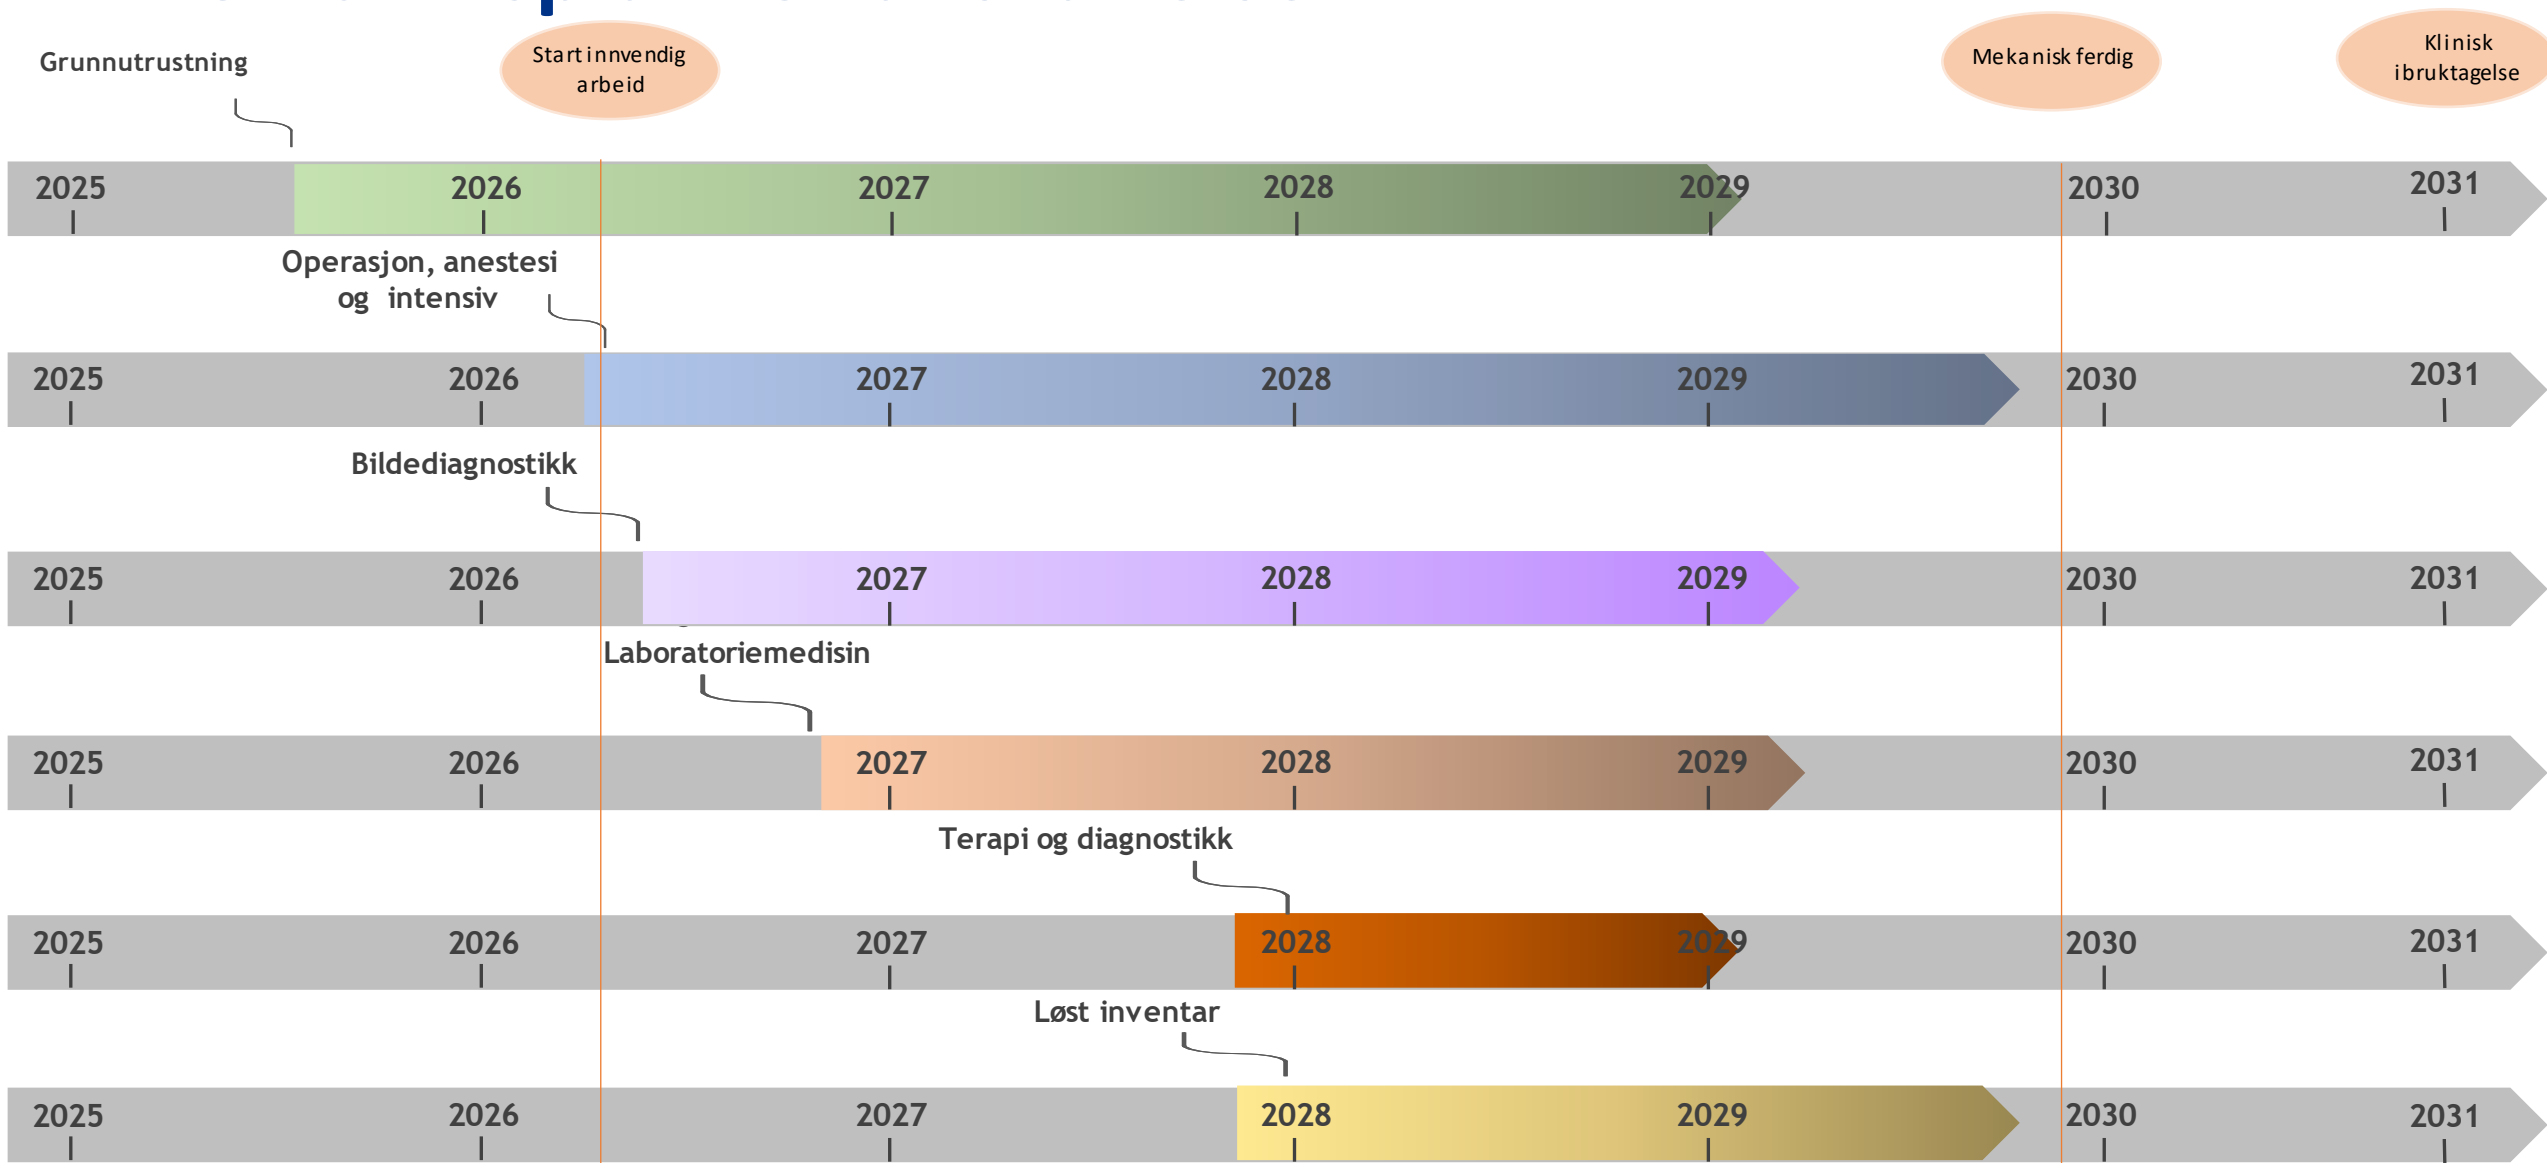

U6C Bildedannende utstyr

Utstyrskategori	Planlagt oppstart
9100 MR	Q1 2027
9150 Angio- og intervensjon perifer	Q2 2027
9155 Angio- og intervensjon kardiologi	Q2 2027
9130 CT	Q4 2027
9170 Røntgen, konvensjonell og multifunksjon	Q1 2028
9160 Gjennomlysning	Q1 2028
9120 PET/CT	Q4 2028
9180 Røntgen traume	Q4 2028
9190 Samlepakke bildediagnostikk	Q1 2030

U6D Laborieutstyr

Utstyrskategori	Planlagt oppstart
9350 Kjøle- og fryseutstyr til laboratorier	Q2 2026
9320 Varmeskap og inkubator	Q3 2026
9340 Prøvepreparering og håndtering	Q1 2027
9210 Analysehall, automasjon og analyse	Q2 2027
9250 Kromatografi og massespektrometri	Q2 2027
9330 Mikroskop	Q1 2028
9230 Analyseinstrumenter	Q1 2028
9270 Spesialutstyr mikrobiologi	Q1 2028
9360 Genteknologi	Q2 2028
9220 Analysehall, analyseinstrumenter	Q3 2028
9310 Forskning og spesialanalyser	Q3 2028
9280 Patologi	Q3 2028
9300 Farmasi	Q4 2028
9390 Samlepakke labutstyr	Q1 2029

U6E Operasjon, anestesi og intensiv

Utstyrskategori	Planlagt oppstart
9430 Uttakssentraler	Q3 2025
9405 Operasjons- og undersøkelseslamper	Q3 2025
9410 Bildestyringssystem	Q1 2027
9440 Navigasjonsutstyr	Q3 2027
9400 Operasjonsbord	Q4 2027
9420 Pasientovervåkning og telemetri	Q4 2027
9460 Samlepakke neonatalutstyr	Q2 2028
9450 Kuvøser og intensivsenger spebarn	Q4 2028
9480 Kirurgiske instrumenter	Q1 2029
9490 Samlepakke operasjon/anestesi/intensiv	Q1 2029

U6F Terapi og diagnostikk

Utstyrskategori	Planlagt oppstart
9548 Søvnregistrering	Q3 2026
9570 Spesialutstyr øye	Q1 2028
9540 Spesialutstyr lunge	Q1 2028
9550 Spesialutstyr for obstetikk	Q4 2028
9580 EKG	Q1 2029
9590 Samlepakke terapi og diagnostikk	Q3 2029

U6G Grunnutrustning

Utstyrskategori	Planlagt oppstart
9612 Autoklav, damp- og lavtemperatur	Q1 2025
9631 Senge- og madrassvask	Q1 2025
9615 Endoskopvask (inkl. vaskebord)	Q1 2025
9620 Vask- og spyledekontaminatorer	Q2 2025
9632 Kabinett- og vognavaskemaskiner	Q2 2025
9600 Elektronisk tøyløsning	Q3 2025
9780 Slynger	Q4 2026
9700 Fysio- og ergoterapi, treningsutstyr	Q1 2027
9665 Robotisering (Renhold)	Q1 2027
9625 Tørkeskap instrumenter	Q3 2027
9660 Renholdsutstyr	Q1 2028
9680 Kjøl- og fryseutstyr	Q1 2028
9790 Samlepakke grunnutrustning	Q1 2028
9614 H2O2 Desinfeksjonsanlegg	Q1 2029
9640 Verkstedutstyr	Q1 2029
9650 Pasientløftere	Q1 2029
9670 Transport- og logistikkutstyr	Q1 2029
9710 Sykehussenger	Q3 2029
9720 Test- og måleutstyr	Q3 2029

U6H Løst inventar

Utstyrskategori	Planlagt oppstart
9870 Barnemøbler og hobbyartikler	Q3 2027
9820 Medisinske møbler	Q1 2028
9860 Senger	Q1 2028
9880 Bårer	Q1 2028
9840 Spesialvogner	Q2 2028
9800 Kontormøbler	Q3 2028
9810 Pasientromsmøbler	Q3 2028
9890 Samlepakke løst inventar	Q1 2029

Viktige momenter for leverandørene

Hva er spesielt med byggeprosjekt?

Høy kompleksitet – mange aktører og grensesnitt – stort behov for koordinering

- 2 prosjekteringsgrupper
- X entreprenører i hvert prosjekt
- Y utstysleverandører
- 24 000 ansatte på OUS

Viktig at prosedyrer og planer følges!

Fysiske grensesnittsavklaringer og løsningsdesign IKT er en del av kontraktsarbeidet

Utsstysleverandører skal blant annet levere planer for

- Leveranse
- Testing
- Opplæring

Kontrakten

Kontraktsdokumentene sendes ut som en del av konkurransebeskrivelsen. Beskriver både krav til utstyret og til leveransen

- Forsikring
- 2 års garanti
- Prisjustering
- Fakturering - betalingsmilepæler
- Valutajustering – Helse Sør-Øst sin finansstrategi avgjør modell

Serviceavtale og avtale for forbruksmateriell er med som opsjoner som kan inngås av OUS / Sykehusinnkjøp

Viktig:

Les alle dokumentene i konkurransegrunnlaget – spør
hvis noe er uklart

HELSE  SØR-ØST

Leveransen

Leveranse til byggeplass – her gjelder det spesielle regler

- Seriøsitetskrav (skal forhindre svart arbeid)
- Innmelding til skatteetaten for å få adgangskort til byggeplass
- HMS kort er obligatorisk.
- Booking av tid for leveranse
- Krav om verneutstyr

NB! Installasjon og montering av utstyr regnes som arbeid på byggeplassen og er omfattet av reglene

Takk for oppmerksomheten!



- Takk for god hjelp og bistand i prosjekteringsarbeidet
- Vi ønsker å videreføre den gode dialogen i anskaffelsesfase
- Vi lytter til markedet
- Stort prosjekt, mange avhengigheter

